Uitvoeringsplanning: BANHOLT - BP Mheerderweg Noord

versie 1.1

Id	Taaknaam	HVD	HVD/dag	Duur	Begindatum	Einddatum
1	BANHOLT - BP Mheerderweg Noord					
2	**VOORBEREIDING**			**0 dagen**	**maa 25-3-24**	**maa 25-3-24**
3	Bezorgen bewonersbrief met definitieve startdatum	1 post	1 post	0 dagen	maa 25-3-24	maa 25-3-24
4	**UITVOERINGPERIODE: civieltechnische werkzaamheden**			**29 dagen**	**maa 8-4-24**	**din 21-5-24**
5	Opdraaien verkeersmaatregelen en inrichten bouwterrein	1 post	1 post	0 dagen	maa 8-4-24	maa 8-4-24
6	Uitzetten en inzagen van asfaltverharding langs toekomstige streklaag	680m1	680m1	2 dagen	maa 8-4-24	din 9-4-24
7	Opbreken teervrije asfaltverharding	410m2	410m2	1 dag	din 9-4-24	din 9-4-24
8	Verwijderen teervrije funderingslaag t.p.v. nieuw profiel	335m2	335m2	1 dag	woe 10-4-24	woe 10-4-24
9	Ontgraven cunet nieuw profiel en boomplantvakken	132m3	66m3	2 dagen	don 11-4-24	vri 12-4-24
10	Bijwoonpunt: afmetingen controleren van plantgaten/plantsleuven	1 post	1 post	0 dagen	vri 12-4-24	vri 12-4-24
11	Aanbrengen RIWI boomsubstraat	100m3	100m3	1 dag	maa 15-4-24	maa 15-4-24
12	Aanbrengen inlage van kunststof t.b.v boomplantbakken	250m2	250m2	1 dag	din 16-4-24	din 16-4-24
13	Aanbrengen boombeluchtingssysteem	10st	10st	1 dag	woe 17-4-24	woe 17-4-24
14	Aanbrengen wortelscherm en ondergrondse boomverankering	10st	10st	1 dag	don 18-4-24	don 18-4-24
15	Aanbrengen wegfundering t.p.v. cunet inritten	145m2	73m2	2 dagen	vri 19-4-24	maa 22-4-24
16	Aanbrengen trottoir- en geleidebanden nieuw profiel	545m1	91m1	6 dagen	din 23-4-24	din 30-4-24
17	Aanbrengen opsluitbanden nieuw profiel	566m1	115m1	5 dagen	woe 24-4-24	din 30-4-24
18	Grond verwerken in plantvakken	100m3	100m3	1 dag	woe 1-5-24	woe 1-5-24
19	Aanbrengen betontegels op een straatlaag van brekerzand	690m2	99m2	7 dagen	woe 1-5-24	maa 13-5-24
20	Aanbrengen betonstraatstenen in langsparkeervakken	136m2	68m2	2 dagen	woe 1-5-24	don 2-5-24
21	Aanbrengen betonstraatstenen in haaksparkeervakken	83m2	83m2	0,75 dagen	vri 3-5-24	vri 3-5-24
22	Aanbrengen dwarsmarkering in nieuwe parkeervakken	22m1	22m1	0,25 dagen	vri 3-5-24	vri 3-5-24
23	Aanbrengen 2 streklagen BSS KF langs trottoirband	330m1	110m1	3 dagen	maa 6-5-24	woe 8-5-24
24	Aanbrengen molgoot van 5 streklagen	350m1	117m1	3 dagen	maa 13-5-24	woe 15-5-24
25	Aanbrengen vlak BSS KF in rijbaan	29m2	29m2	1 dag	din 14-5-24	din 14-5-24
26	Aanbrengen inritconstructie + trottoir t.p.v. Past. Engelenstraat	15m2	15m2	1 dag	woe 15-5-24	woe 15-5-24
27	Spitten en ploegen plantvakken en gazon incl. grondverbetering	11are	11are	1 dag	din 14-5-24	din 14-5-24
28	Zaaien gazon	8,5are	8,5are	1 dag	woe 15-5-24	woe 15-5-24
29	Aanbrengen funderingsplaat t.b.v. geboorde putafdekking	14st	4st	4 dagen	woe 8-5-24	woe 15-5-24
30	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool + controle huisaansluitingen	370m1	370m1	1 dag	maa 13-5-24	maa 13-5-24
31	Stoppunt S9: Camera-inspectie riolering	1 post	1 post	0 dagen	maa 13-5-24	maa 13-5-24
32	Stoppunt S8: afgewerkte fundering	1 post	1 post	0 dagen	maa 13-5-24	maa 13-5-24
33	Stoppunt S10: Controle tussenlaan asfalt	1 post	1 post	0 dagen	maa 13-5-24	maa 13-5-24
34	Aanbrengen asfaltonderlaag OL-B 60mm (rijweg Past. Engelenstraat)	4ton	4ton	0,5 dagen	don 16-5-24	don 16-5-24
35	Aanbrengen asfalttussenlaag TL-B	258ton	258ton	0,5 dagen	don 16-5-24	don 16-5-24
36	Aanbrengen asfaltdeklaag SMA-NL 8A	130ton	130ton	0,5 dagen	don 16-5-24	don 16-5-24
37	Boren en aanbrengen nieuwe putafdekkingen	14st	7st	2 dagen	vri 17-5-24	din 21-5-24
38	**UITVOERINGPERIODE: cultuurtechnische werkzaamheden**			**9 dagen**	**maa 2-9-24**	**don 12-9-24**
39	Planten bomen incl. gietranden en bovengrondse boomverankering	29st	10st	3 dagen	maa 2-9-24	woe 4-9-24
40	Aanbrengen sierplantsoen	1035st	345st	3 dagen	don 5-9-24	maa 9-9-24
41	Planten haagplantsoen	180m1	90m1	2 dagen	din 10-9-24	woe 11-9-24
42	Knippen haagplantsoen	450m2	450m2	1 dag	don 12-9-24	don 12-9-24

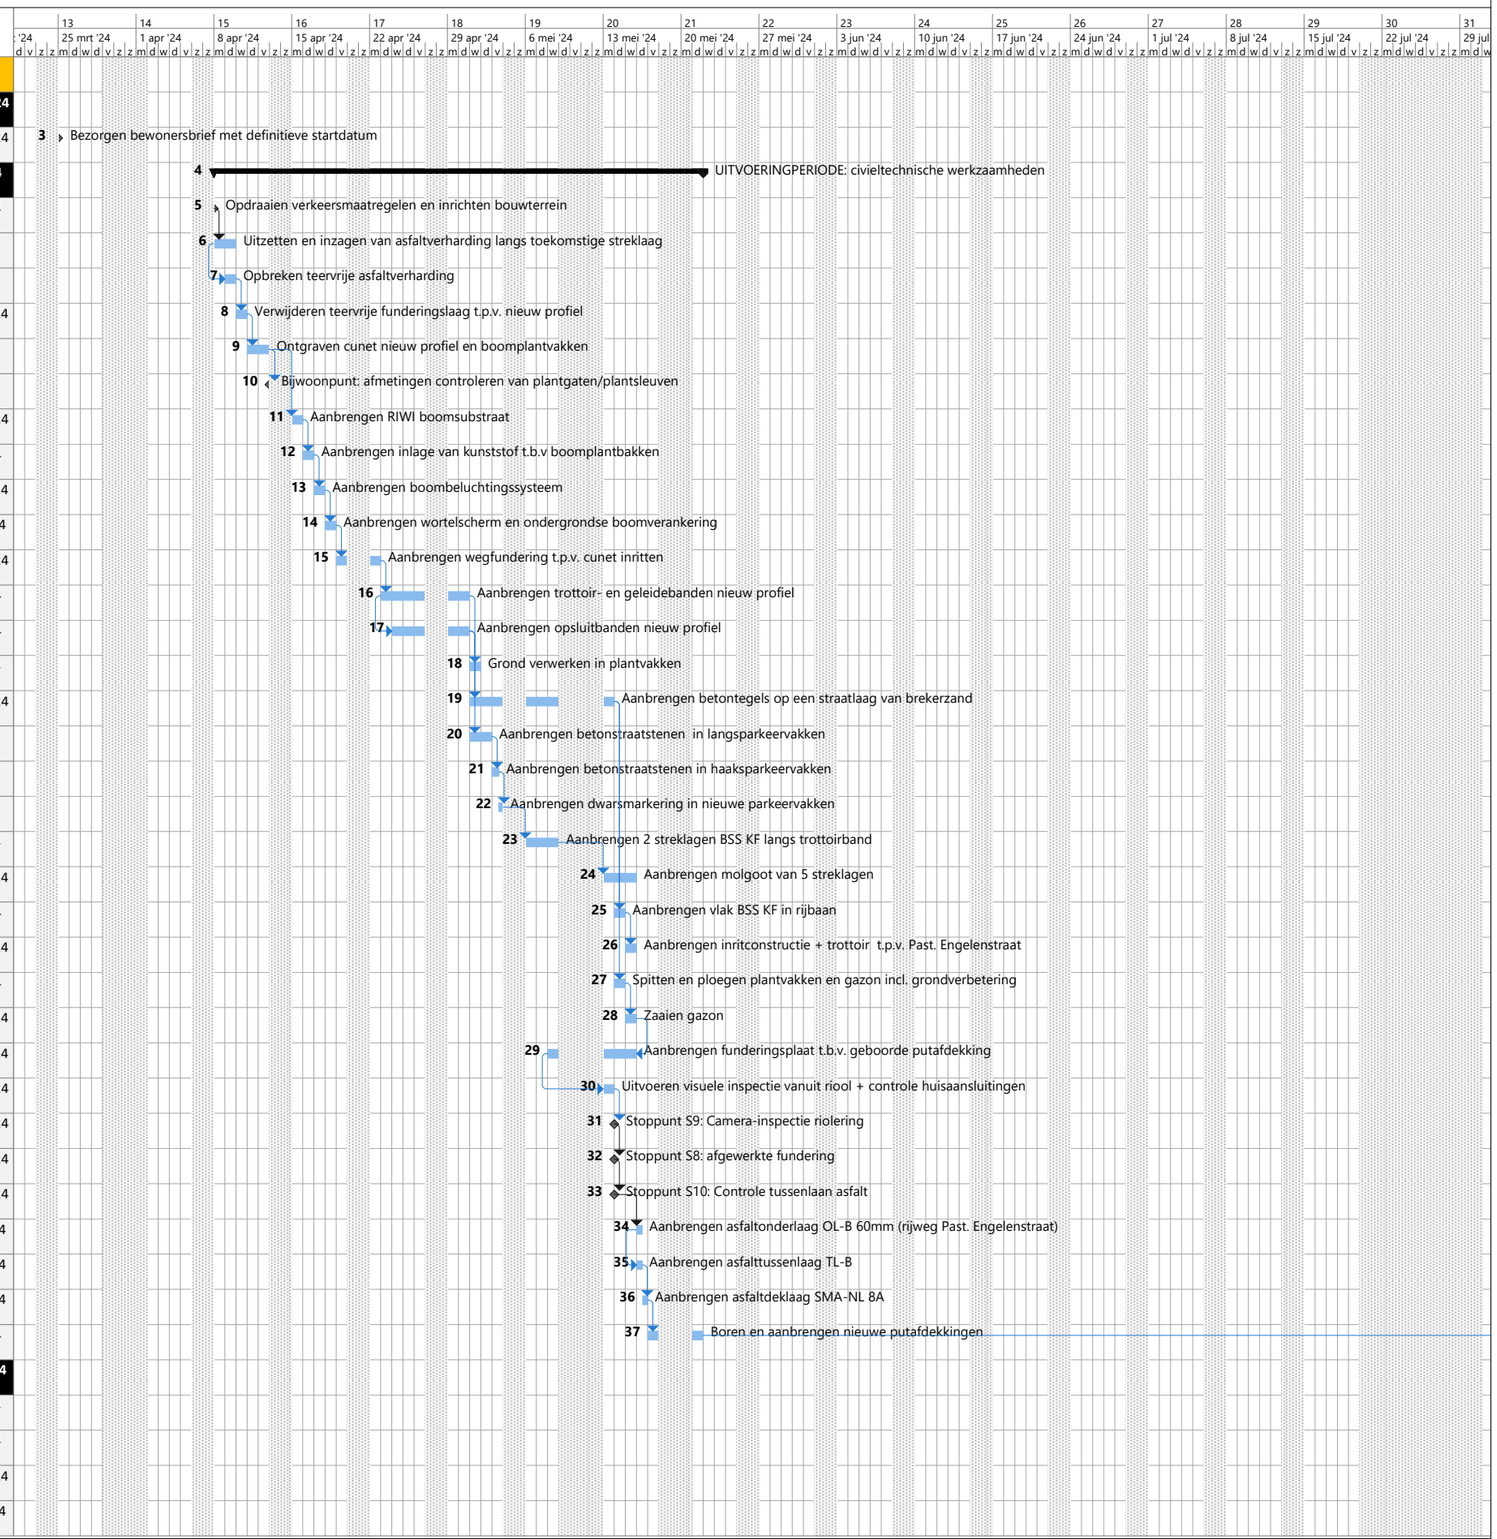

Opgesteld door: LTR
Controle door: PSU
Datum: din 19-3-24

Kritieke splitsing | Splitsing | Samenvatting | Externe taken | Deadline
Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Externe mijlpaal | Kritiek
